



MAX PLANCK
digital library



Statusbericht DLC

Projekttreffen, Frankfurt, 28./29./30.05.2012

Andrea Kulas @ MPDL



Except where otherwise noted, this work is licensed under
<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/de/>




Themen

- Wo stehen wir?
- Meilensteine
- Ziele bis Januar 2013
- Zufrieden?
- Was folgt?



Wo stehen wir? – DLC im Zeitraffer

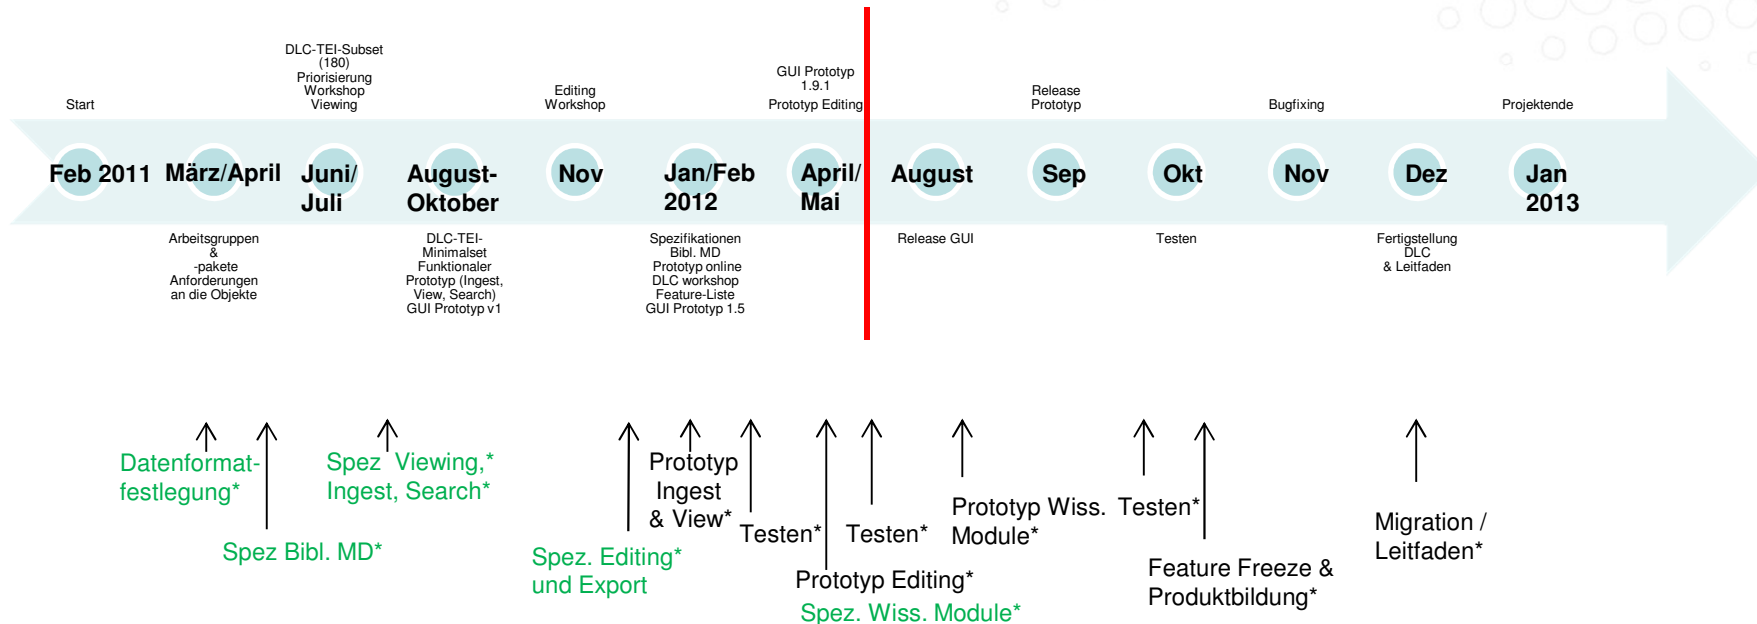

** ursprünglicher Zeitplan (aufgrund der erforderlichen Abstimmungsprozesse nicht in dieser Form umsetzbar)



Meilensteine

Wann in 2012/13?	GUI	Prototyp
20. August	Release Version 1	
August / September	Testen	
31. September		DLC Prototype Release
Oktober		Testen
November	Release Version 2 (30.)	Bugfixing
Dezember		Fertigstellung DLC Anwendung
Januar 2013		Migration/Ingest



Wo stehen wir? - Aktuelle Projektstruktur

Institute

MPDL

Lenkungskreis DLC
(5 Projektleiter):
Entscheidungen

Projektkoordination
/stellvertretende PL
MPDL:
Kommunikation mit
Arbeitsgruppen,
Lenkungskreis und
MPDL

Arbeitsgruppen-
leiter (PM):
Vorbereitung
Entscheidungen
und Reporting
AG: Viewing,
Editing, Bibl. MD,
Datenformat,
(Anforderungen,
Veranstaltungen)

Entwickler:
Entwicklungsarbeit
Funktionalitäten
DLC Prototyp

GUI: Interface für
DLC Prototyp

Person, die
funktionale
Anforderungen
spezifizierte?*

Die Kommunikation ist zwischen allen
Gruppen gewährleistet

* Diese Person
existierte nie in DLC



Wo stehen wir? - MPDL

- Wilhelm Frank: Projektleiter
- Lu Yu: seit 1.2.2012 Entwicklung
- Friedericke Kleinfercher: seit 1.5.2012 Entwicklung
(44 % Stelle)
(Markus Haarländer bis Mitte Juli nicht in DLC)
- Marco Schlender: seit 1.4.2012 GUI Entwicklung
(30 % Stelle)
(Rupert Kiefl nicht mehr in DLC)
- Denise Unfried: GUI Design (10 % Stelle)
- Andrea Kulas: seit 1.2.2012 Projektkoordination (50 % Stelle)



Ziele bis Januar 2012

- Generische DLC Anwendung mit den Funktionalitäten
 - Viewing
 - Editing
 - Manueller Ingest
 - Batch Ingest
 - Search
 - Export
 - Annotationen.....von Digitalen Objekten (Werke bestehend aus scans, Volltexten und Metadaten)
- Digitalisierungsleitfaden



Zufrieden?

- Wurde alles von der Feature-Liste geschafft?
- Sind die Institute mit dem Projektergebnis zufrieden?
- Ist die MPDL mit dem Ergebnis zufrieden?
- Wie sieht es mit Nachnutzung aus?

Beantwortung am Schluss des Projektes!



Was folgt? – DLC 2?

Genauere Klärung der folgenden drei Säulen ist entscheidend

Was?

Inhalt

Wie?

Entscheidungs-
strukturen

Wer?

Projektteilnehmer
≙ Zielgruppe ≙
Aufgaben



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
